

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 1266 / 2022 / REGOV/CV

Cascavel, 21 de Novembro de 2022

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal de Capanema

Assunto: Autoriza Saque da 1ª Parcela com Pendências para Desbloqueio dos Recursos na Plataforma + Brasil
Ref.: CR 924496/2021/MAPA/CAIXA
Objeto: Pavimentação Poliédrica em Estradas Vicinais - Linha Boa Vista Cristo Rei
Conta corrente: 1256.006.00647281-2
Data vigência: 30/09/2024

Senhor Prefeito Municipal,

1. Tendo em vista o crédito de recursos e em observância à Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU Nº 558/2019 e ao regime simplificado, considerando que o valor de repasse do contrato é inferior a R\$ 1.500.000,00, esta autorização de saque foi realizada com base nos documentos apresentados que informam a execução acumulada da obra de 2,67%.

1.1 A operacionalização do contrato é por OBTV e a execução financeira será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil e informações referentes a esta parcela constam abaixo:

Valor de Repasse	R\$ 7.681,47
Valor de Contrapartida	R\$ 8,01 *aportar e classificar
Valor Total	R\$ 7.689,48

2. Para o desbloqueio do recurso o Conveniente deverá concluir os procedimentos abaixo, **observado o prazo máximo de 4 dias:**

- Inclusão do RRE 01 assinado pelo Fiscal do Município na aba acompanhamento das obras - documentação complementar na P+B;
- Aporte e classificação da contrapartida no valor de **R\$ 8,01;**
- Completo registro aba documentos de liquidação na Plataforma + Brasil;
- Geração do relatório documentos de liquidação incluídos;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

e) Comunicar a conclusão dos trâmites acima a REGOV/CV por e-mail informando também o endereço para verificação de autenticidade do documento de liquidação.

2.1 O documento de liquidação incluído (Nota Fiscal e/ou DANFE) deverá ser legível, preferencialmente anexar o documento original em formato PDF, contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa/Gestor; e em caso de retenção de tributos o valor deverá ser registrado e respectiva guia anexada em campo próprio.

3. De acordo com a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU Nº 558/2019 o recurso creditado é aplicado automaticamente em fundos FICTV, no entanto caso o prazo previsto de uso/desbloqueio seja superior a 30 dias, deverá ser comandada pelo conveniente a aplicação, via Plataforma +Brasil em caderneta de poupança.

4. A **prestação de contas desta parcela** será realizada exclusivamente na Plataforma + Brasil, mediante a atualização das informações e o devido registro do(s) documento(s):

- No caso de retenção de tributos deve ser anexado comprovante de recolhimento das guias na aba Movimentações financeiras no módulo execução, acessar “detalhar” da respectiva guia e incluir documento aba “anexos”;
- Preencher o relatório Pagamentos Realizados da parcela, e enviar para análise, comunicando o envio.

5. Por oportuno, seguem as providências do Contrato de Repasse a serem regularizadas pelo CONVENIENTE nos prazos abaixo estabelecidos e que deverão ser incluídas na Plataforma +Brasil, aba anexos e após sua inclusão favor informar esta REGOV pelo e-mail regovcv@caixa.gov.br, para gerar o protocolo de análise:

Providências	Prazo para solução
Apresentar evolução das obras conforme cronograma físico-financeiro vigente (30,63%).	Próxima autorização de saque
Alimentar a aba “Acompanhamento de Obra” na Plataforma +Brasil, observados os tutoriais 5 a 7 disponíveis em https://redemaisbrasil.plataformamaisbrasil.gov.br/noticia_detalhe/fluxo-de-acompanhamento-da-execucao-da-obra-na-plataforma-brasil/ .	Quando atingir o marco de vistoria (100% de obra executada)
Apresentar documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse, por parte do Conveniente, conforme legislação aplicada ao processo de licitação e contratação.	Inspeção técnica final

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Declaração do Representante Legal do Tomador informando que não haverá instalação de placa de inauguração de obra ou no caso de optar pela instalação de placa, apresentação de registro fotográfico georreferenciado que demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras que será fornecido por esta REGOV. A placa de inauguração somente poderá ser confeccionada após a aprovação do layout pelo setor responsável da CAIXA.	Inspeção técnica final
--	------------------------

6. No caso de evento de inauguração, a Placa de Inauguração de empreendimento com investimento do Governo Federal, deverá ser confeccionada conforme modelo disponibilizado pela CAIXA que segue os padrões publicados pela SECOM (Secretaria Especial de Comunicação Social, da Presidência da República).

6.1 O modelo será enviado pela REGOV mediante solicitação por e-mail, em momento oportuno à confecção.

6.2 As inaugurações de obras deverão ser comunicadas à CAIXA com antecedência de no mínimo 30 dias, em tempo hábil para participação de representantes governamentais.

7. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

MIGUEL FIGUEIRÓ

Assistente Júnior

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO

Gerente de Filial Substituto Eventual

Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

0 0421

Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício n°: 01-2023

CAPANEMA/PR, 31 de janeiro de 2023

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 3ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1081135-07 - SICONV nº 924496/2021

Objeto: Pavimentação de Estradas Vicinais
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 3ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 287.700,00	R\$ 131.967,01	R\$ 204.047,25
Contrapartida Financeira:	R\$ 300,00	R\$ 137,61	R\$ 212,77
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 288.000,00	R\$ 132.104,62	R\$ 204.260,02
Execução Física:	-	45,87%	70,92%

- 2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.
- 3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.
- 4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal

Nº OPERAÇÃO
1081135-07

Nº SICONV
924496/2021

PROponente TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Apelido Empreendimento
Pavimentação Polidétrica Linha Cristo Rei Boa Vista

Nome da Empresa
AA Colussi & Cia Ltda

Nº CTEF
161/2022

Medição: 1

Período: 30/06/2022 a 26/10/2022

% Realizado Período.: 2,67%

% Realizado Acum.: 2,67%

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	DRENAGEM
4	TERRAPLENAGEM
5	PAVIMENTAÇÃO
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0

SERVIÇOS PRELIMINARE	DRENAGEM	TERRAPLENAGEM	PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO VERTICAL	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																		

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1																		
		1																

0.50422



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica Linha Cristo Rei Boa Vi	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **1** Período: **30/06/2022 a 26/10/2022** % Realizado Período.: **2,67%** % Realizado Acum.: **2,67%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5																									
01	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
02																									
03																									
04																									
05																									
06																									
07																									
08																									
09																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									

Medições	Data das Medições												
	26/10/2022	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	2,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	7.689,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
	R\$	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48	7.689,48

CAPANEMA/PR
Local
quinta-feira, 10 de novembro de 2022
Data

AMANDA PEREIRA DE
ANDRADE:01305183282
Assinado de forma digital por AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Dados: 2022.11.10 11:13:22 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Amanda Pereira de Andrade
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: RO 10505/D
ART/RRT: 1720225342140

0 0423

Ofício nº: 035-2022

CAPANEMA/PR, 22 de novembro de 2022

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOVAssunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1081135-07 - SICONV nº 924496/2021Objeto: Pavimentação de Estradas Vicinais
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 287.700,00	R\$ 64.398,77	R\$ 72.080,24
Contrapartida Financeira:	R\$ 300,00	R\$ 67,15	R\$ 75,16
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 288.000,00	R\$ 64.465,92	R\$ 72.155,40
Execução Física:	-	22,38%	25,05%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

AMERICO
BELLE:24059
587915

Assinado de forma digital por AMERICO BELLE:24059587915
Dados: 2022.11.22 16:31:04 -03'00'

Américo Bellé
Prefeito Municipal



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica Linha Cristo Rei Boa V	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **2** Período: **27/10/2022 a 22/11/2022** % Realizado Período.: **22,38%** % Realizado Acum.: **25,05%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	DRENAGEM																									
4	TERRAPLENAGEM			1																						
5	PAVIMENTAÇÃO							2																		
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL																									
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									

050425



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vi	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **2** Período: 27/10/2022 a 22/11/2022 % Realizado Período.: 22,38% % Realizado Acum.: 25,05%

Nº do Evento	Título dos Eventos
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
05 DRENAGEM																										
01 DA TERRAPLENIA GEM/prancha																										
02 DA TERRAPLENIA GEM/prancha																										
03 DA TERRAPLENIA GEM/prancha																										
04 DA TERRAPLENIA GEM/prancha																										
01 DA PAVIMENTAÇÃO prancha 01																										
02 DA PAVIMENTAÇÃO prancha 02																										
03 DA PAVIMENTAÇÃO prancha 03																										
04 DA PAVIMENTAÇÃO prancha 04																										
04 Sinalização Vertical																										

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Medições	Data das Medições											
	26/10/2022	22/11/2022										
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 2,67%	22,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 7.689,48	64.465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 2,67%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%	25,05%
	R\$ 7.689,48	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40	72.155,40

CAPANEMA/PR
Local
terça-feira, 22 de novembro de 2022
Data

AMANDA PEREIRA DE
ANDRADE:01305183282
Assinado de forma digital por AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Dados: 2022.11.22 16:24:45 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Amanda Pereira de Andrade
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: RO 10505/D
ART/RRT: 1720225342140

05426



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vista	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	REPASSE 287.700,00	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-22 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA	Licitado / Em Execução	7200,02	m²	161/2022	2	288.000,00	7.689,48	64.465,92	72.155,40	25,05%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(2,67%)	(22,38%)	(25,05%)	
							Repasse	287.700,00	7.681,47	64.398,77	72.080,24	
							Contrapartida	300,00	8,01	67,15	75,16	25,05%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	288.000,00	7.689,48	64.465,92	72.155,40	

Acumulado Anterior: 2,67%

Observações:

CAPANEMA/PR

Local AMERICO
BELLE:2405958791
5

Assinado de forma digital por AMERICO BELLE:2405958791
Data: 2022.11.22 16:32:08 -03'00'

Representante Tomador
Nome: Américo Bellé
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

PMV3.0.4

terça-feira, 22 de novembro de 2022

Data

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282

Assinado de forma digital por AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Data: 2022.11.22 16:23:50 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Amanda Pereira de Andrade
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: RO 10505/D
ART/RRT: 1720225342140

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

1/1

0504271



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
1081135-07

Nº SICONV
924496/2021

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vi

NOME DA EMPRESA
AA Colussi & Cia Ltda

Nº CTEF
161/2022

Medição: **3**

Período: **23/11/2022 a 27/01/2023**

% Realizado Período.: **45,87%**

% Realizado Acum.: **70,92%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	DRENAGEM
4	TERRAPLENAGEM
5	PAVIMENTAÇÃO
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0

SERVIÇOS PRELIMINARES	DRENAGEM	TERRAPLENAGEM EM(prancha 01 04)	TERRAPLENAGEM EM(prancha 02 04)	TERRAPLENAGEM EM(prancha 03 04)	TERRAPLENAGEM EM(prancha 04 04)	PAVIMENTAÇÃO O prancha 01 04	PAVIMENTAÇÃO O prancha 02 04	PAVIMENTAÇÃO O prancha 03 04	PAVIMENTAÇÃO O prancha 04 04	Sinalização Vertical	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-----------------------	----------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos.

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

1	1																								
2																									
3																									
4			1	3	3																				
5							2	3	3																
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36																									
37																									
38																									
39																									

050428



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica Linha Cristo Rei Boa Vi	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **3** Período: **23/11/2022 a 27/01/2023** % Realizado Período.: **45,87%** % Realizado Acum.: **70,92%**

Nº do Evento	Título dos Eventos
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0

SERVIÇOS PRELIMINARES	DRENAGEM	TERRAPLENAG EM prancha 01	TERRAPLENAG EM prancha 02	TERRAPLENAG EM prancha 03	TERRAPLENAG EM prancha 04	PAVIMENTAÇÃO prancha 01 04	PAVIMENTAÇÃO prancha 02 04	PAVIMENTAÇÃO prancha 03 04	PAVIMENTAÇÃO prancha 04 04	Sinalização Vertical	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

Medições	Data das Medições											
	26/10/2022	22/11/2022	27/01/2023									
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	2,67%	22,38%	45,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	7.689,48	64.465,92	132.104,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	2,67%	25,05%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%	70,92%
	R\$	7.689,48	72.155,40	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02	204.260,02

CAPANEMA/PR
Local

terça-feira, 31 de janeiro de 2023
Data

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Assinado de forma digital por AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Dados: 2023.01.31 11:01:35 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Amanda Pereira de Andrade
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: RO 10505/D
ART/RR: 1720225342140

050429



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica Linha Cristo Rei Boa Vista	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	REPASSE 287.700,00	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA	Licitado / Em Execução	7200,02	m²	161/2022	3	288.000,00	72.155,40	132.104,62	204.260,02	70,92%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(25,05%)	(45,87%)	(70,92%)	
							Repasse	287.700,00	72.080,24	131.967,01	204.047,25	
							Contrapartida	300,00	75,16	137,61	212,77	70,92%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	288.000,00	72.155,40	132.104,62	204.260,02	

Acumulado Anterior: 25,05%

Observações:

CAPANEMA/PR

Local

Representante Tomador

Nome: Américo Bellé

Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:

Cargo:

PMv3.0.4

terça-feira, 31 de janeiro de 2023

Data

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282 Assinado de forma digital por AMANDA PEREIRA DE ANDRADE:01305183282
Data: 2023.01.31 11:02:13 -03'W'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Amanda Pereira de Andrade

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU: RO 10505/D

ART/RRT: 1720225342140

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vista	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	REPASSE 287.700,00	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 3	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
------	-------------------	----------	------------	-------	--------------------------------	-------------	-------------------	----------------------------	------------	-------------------------------	-----------------------

Ofício nº: 02-2023

CAPANEMA/PR, 20 de março de 2023

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOVAssunto: 4ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1081135-07 - SICONV nº 924496/2021Objeto: Pavimentação de Estradas Vicinais
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 4ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 287.700,00	R\$ 83.652,75	R\$ 287.700,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 300,00	R\$ 87,23	R\$ 300,00
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 288.000,00	R\$ 83.739,98	R\$ 288.000,00
Execução Física:	-	29,08%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

AMERICO
BELLE:24059
Américo Bellé 587915
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por AMERICO BELLE:24059587915
Dados: 2023.03.21 08:22:24 -03'00'



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica Linha Cristo Rei Boa V	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **4** Período: **28/01/2023 a 20/03/2023** % Realizado Período.: **29,08%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	DRENAGEM		4																							
4	TERRAPLENAGEM			1	3	3	4																			
5	PAVIMENTAÇÃO							2	3	3	4															
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL											4														
7	0																									
8	0																									
9	0																									
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									

0.0435



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação Polidétrica Linha Cristo Rei Boa Vi	NOME DA EMPRESA AA Colussi & Cia Ltda	Nº CTEF 161/2022
---------------------------	--------------------------	--	--	--	---------------------

Medição: **4** Período: **28/01/2023 a 20/03/2023** % Realizado Período.: **29,08%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									
50	0																									

Medições	Data das Medições												
		26/10/2022	22/11/2022	27/01/2023	20/03/2023								
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	2,67%	22,38%	45,87%	29,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	7.689,48	64.465,92	132.104,62	83.739,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	2,67%	25,05%	70,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	7.689,48	72.155,40	204.260,02	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00

CAPANEMA/PR
Local

segunda-feira, 20 de março de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Amanda Pereira de Andrade
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: RO 10505/D
ART/RRT: 1720225342140

gov.br
AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
Data: 20/03/2023 17:07:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vista	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	REPASSE 287.700,00	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	---------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período		
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA	Licitado / Em Execução	7200,02	m²	161/2022	4	288.000,00	204.260,02	83.739,98	288.000,00	100,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(70,92%)	(29,08%)	(100,00%)	
							Repassse	287.700,00	204.047,25	83.652,75	287.700,00	
							Contrapartida	300,00	212,77	87,23	300,00	100,00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	288.000,00	204.260,02	83.739,98	288.000,00	

Acumulado Anterior: 70,92%

Observações:

CAPANEMA/PR

Local

Assinado de forma digital por AMERICO
 Representante Tomador AMERICO
 Nome: Américo Bellé BELLE:24059587 BELLE:24059587915
 Cargo: Prefeito Municipal 915
 Dados: 2023.03.21 08:21:44 -03'00'

segunda-feira, 20 de março de 2023

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: Amanda Pereira de Andrade
 Profissão: Engenheira Civil
 CREA/CAU: RO 10505/D
 ART/RRT: 1720225342140



Documento assinado digitalmente
 AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
 Data: 20/03/2023 17:05:13-0300
 Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	Nº OPERAÇÃO 1081135-07	Nº SICONV 924496/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrca Linha Cristo Rei Boa Vista	MUNICÍPIO / UF CAPANEMA/PR	REPASSE 287.700,00	CONTRAPARTIDA 300,00	INVESTIMENTO 288.000,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
------	-------------------	----------	------------	-------	-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------------------------



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO Nº 161/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2022, para a EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS- LINHA BOA VISTA CRISTO REI, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 924496/2021 MAPA/ CAIXA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, CELEBRADO ENTRE A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME E O MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, NA FORMA ABAIXO:

Trata o presente de Termo de Recebimento referente aos serviços do contrato 161/2022, Tomada de Preços nº 06/2022 cujo objeto é EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS- LINHA BOA VISTA CRISTO REI, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 924496/2021 MAPA/ CAIXA do município de Capanema-PR, executado pela A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME de um lado a CONTRATANTE MUNICÍPIO DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.972.760/0001-60, representado pela servidora Sra. Amanda Pereira de Andrade, Engenheira Civil II – Matrícula 3523-1 CREA RO-10505/D, Fiscal do Contrato e, de outro lado, a CONTRATADA A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME, inscrita sob CNPJ nº 84.840.503/0001-65, tendo como responsável técnico o Sr. SASCHA IAN MANICA COLUSSI, CREA PR- 184665/D com sede na Rua OTAVIO KISCHNER, 1339 Centro de Capanema-PR tendo como Representante Legal o SR. ALDEMIR COLUSSI , CPF nº524.947.489-68, conforme consta no processo base da Tomada de Preços 06/2022.

Considerando que, após vistoria realizada em 20/03/2023 pela fiscal do contrato, identificou-se que os serviços e obras do respectivo segmento foram executados e concluídos em conformidade ao disposto no termo contratual, seus projetos e especificações respectivas, apresentando resultados aceitáveis, conforme relatório fotográfico anexado, encaminhado juntamente com este termo de recebimento.

Não obstante, reitero através do item 10.5 da Cláusula décima do contrato celebrado entre as partes que estabelece:

"10.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exige a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

050436

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).” que faz referência ao artigo 618 do código civil.

Para firmeza do que foi dito, as partes indicadas, neste ato firmam este termo:

Capanema-PR, 20 de março de 2023.

**ALDEMIR
COLUSSI:52
494748968**

Digitally signed by ALDEMIR
COLUSSI:52494748968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=19880129000106, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=ARCERTIFY, ou=
RFB e-CPF A1, cn=ALDEMIR
COLUSSI:52494748968
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.03.20 17:17:07-0300
Foxit PDF Editor Version: 12.0.1

A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME
ALDEMIR COLUSSI
CPF 524.947.489-68
CONTRATADO

Documento assinado digitalmente
gov.br SASCHA IAN MANICA COLUSSI
Data: 20/03/2023 17:20:26-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SASCHA IAN MANICA COLUSSI
CREA PR- 184665/D
RESP. TÉCNICO CONTRATADA

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
Data: 20/03/2023 16:50:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
FISCAL DO CONTRATO
CREA RO-10505/D
MATRÍCULA 3523-1



ANEXO I

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE RECEBIMENTO DE OBRA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES



FOTO 1- PLACA DA OBRA



2. DRENAGEM

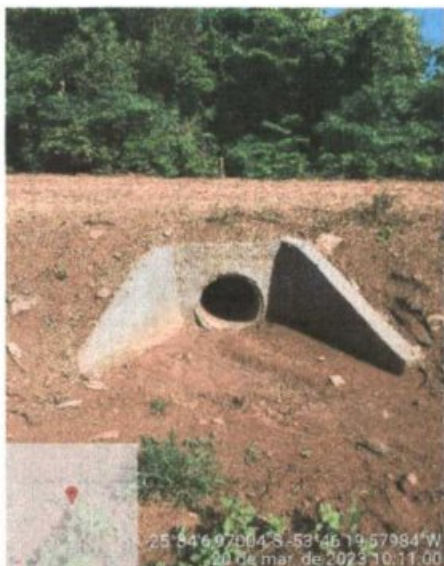


FOTO 2- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 01



FOTO 3- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 01

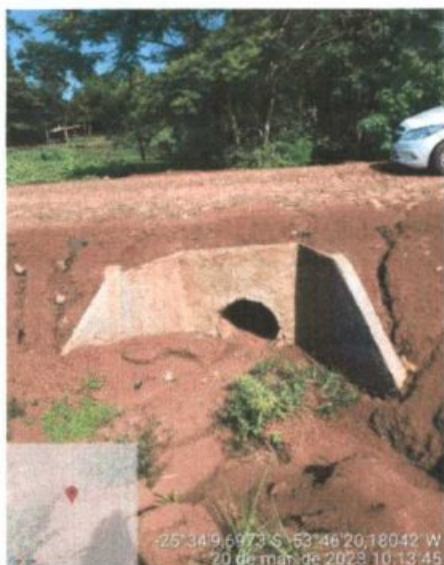


FOTO 4- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 01



FOTO 5- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 01

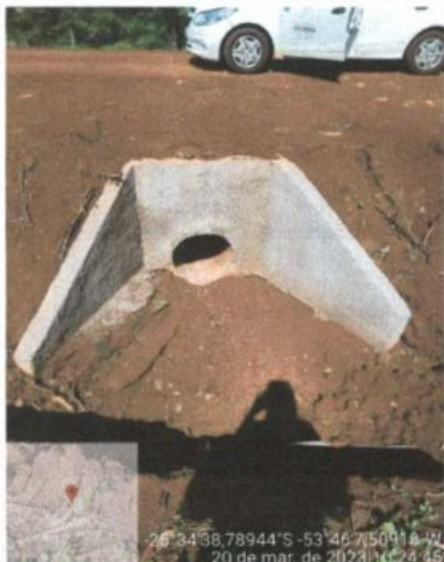


FOTO 4- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 04



FOTO 5- OBRA DE ARTE CORRENTE TRECHO 04

3. TERRAPLENAGEM
4. PAVIMENTAÇÃO

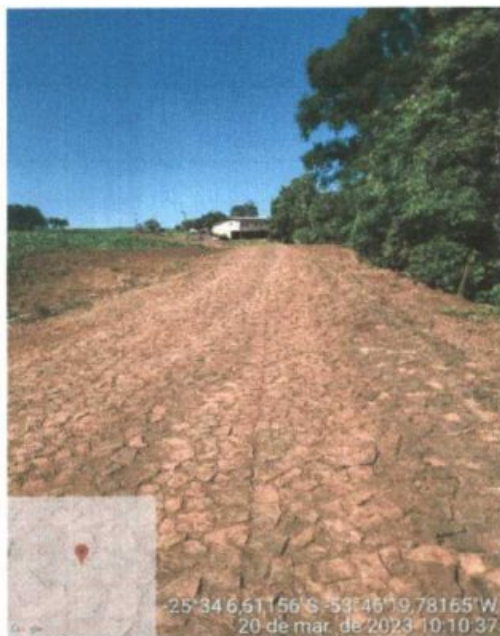


Foto 6-Pavimentação Poliédrica Trecho 01

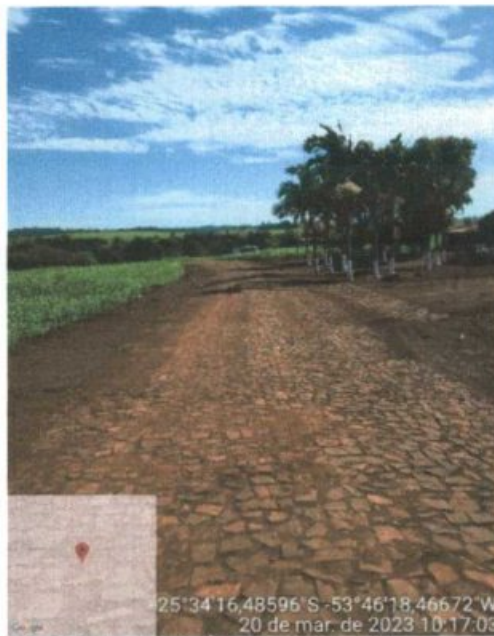


Foto 7-Pavimentação Poliédrica Trecho 01



Município de Capanema - PR

Secretaria de Planejamento e Projetos

0442

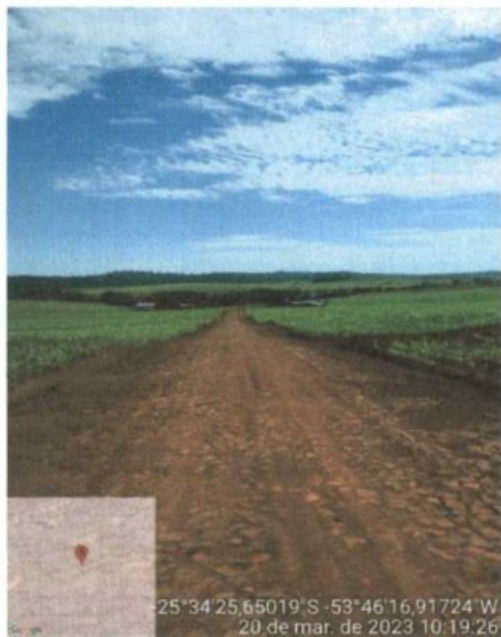


Foto 8-Pavimentação Poliédrca Trecho 02

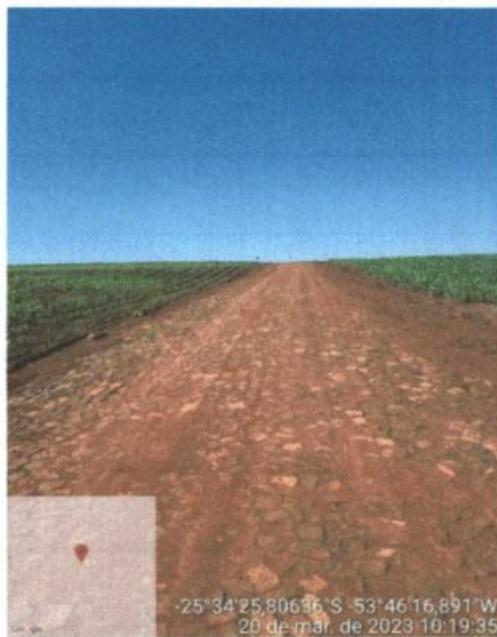


Foto 9-Pavimentação Poliédrca Trecho 03

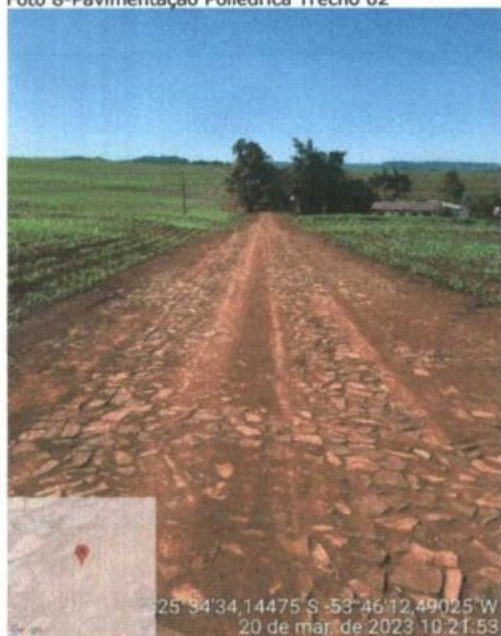


Foto 10-Pavimentação Poliédrca Trecho 04


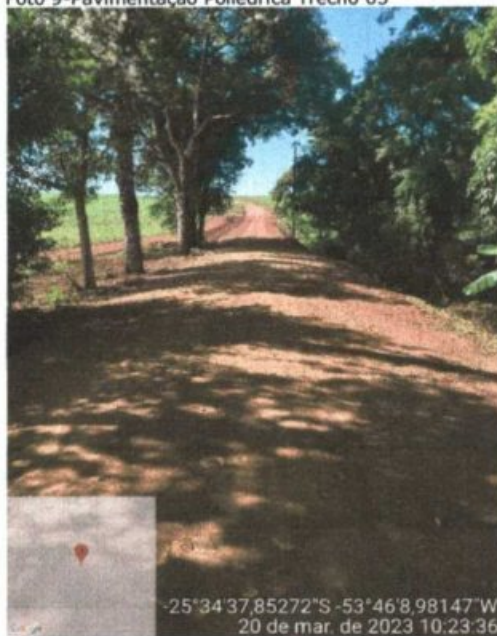



Foto 11-Pavimentação Poliédrca Trecho 04

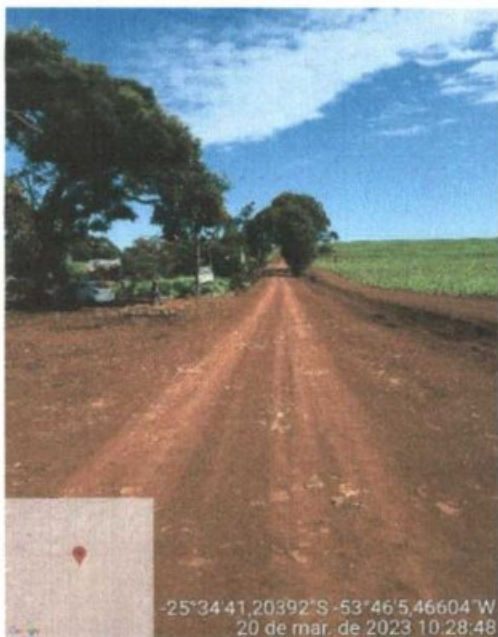

-25°34'41,20392"S -53°46'5,46604"W
20 de mar. de 2023 10:28:48


Foto 12-Pavimentação Poliédrica Trecho 04

5. SINALIZAÇÃO VERTICAL

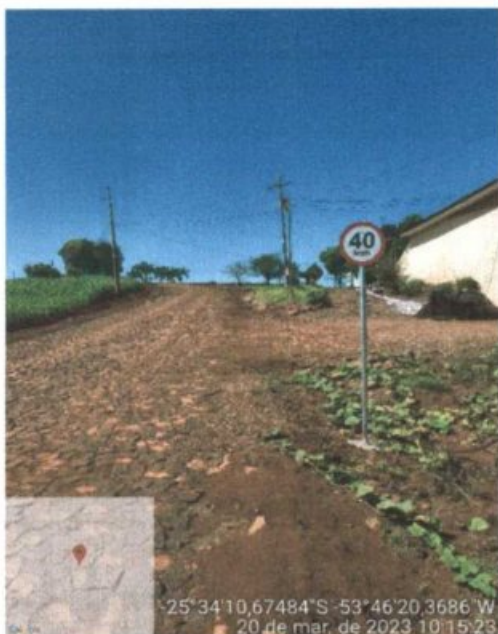

-25°34'10,67484"S -53°46'20,3686"W
20 de mar. de 2023 10:15:23

Foto 13-Placa R19/40KM/H

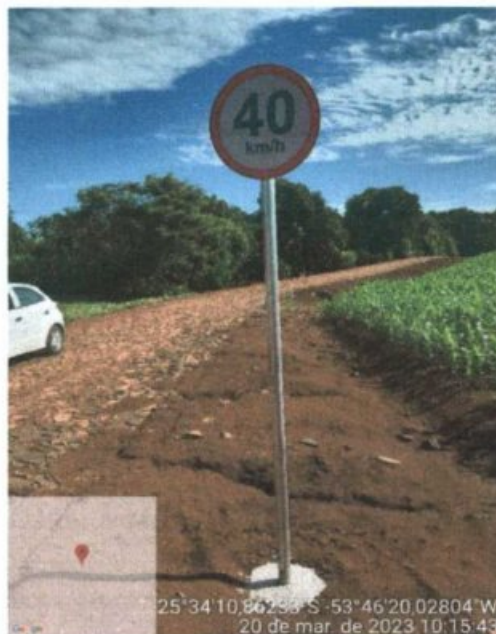

-25°34'10,86253"S -53°46'20,02804"W
20 de mar. de 2023 10:15:43

Foto 14-Placa R19/40KM



Foto 15-Placa R19/40KM/H



Foto 16-Placa R19/40KM/H



Foto 17-Placa R19/40KM/H



Foto 18-Placa R19/40KM/H



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

03445



Foto 18-Placa R19/40KM/H

Capanema-PR, 20 de março de 2023.

**ALDEMIR
COLUSSI:524
94748968**

Digitally signed by ALDEMIR
COLUSSI:52494748968
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Ministério da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCEITFY, ou=RFB
e=CPF AL, cn=ALDEMIR COLUSSI:52494748968
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.03.20 17:17:41-03'00'
Post-PDF Editor Version: 12.0.1

**A. A. COLUSSI E CIA LTDA-ME
ALDEMIR COLUSSI
CPF 524.947.489-68
CONTRATADO**

Documento assinado digitalmente
gov.br SASCHA IAN MANICA COLUSSI
Data: 20/03/2023 17:19:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**SASCHA IAN MANICA COLUSSI
CREA PR- 184665/D
RESP. TÉCNICO CONTRATADA**

Documento assinado digitalmente
gov.br AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
Data: 20/03/2023 16:51:57-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
FISCAL DO CONTRATO
CREA RO-10505/D
MATRÍCULA 3523-1**

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 – Centro – 85760-000
Fone:(46)3552-1321

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 – Bairro Centro
85.810-070 – Cascavel - PR

Ofício nº 0261 / 2023 / REGOV/CV

Cascavel, 3 de Abril de 2023

A Sua Excelência o Senhor
Américo Bellé
Prefeito Municipal
Município de Capanema

Assunto: **Pendências técnicas para Vistoria**
Ref.: **CR 924496/2021/MAPA/CAIXA**
Objeto: **pavimentação de estradas vicinais**
Prazo para atendimento: **10/04/2023**

Senhor Prefeito Municipal,

1. Recebemos do Município de Capanema solicitação de desbloqueio em 20/03/2023, com documentação anexa na aba Acompanhamento de Obras no portal TransfereGov para vistoria.
2. Em 31/03/2023 estivemos na área de intervenção e não foi possível avaliar cerca de 200m no início do trecho quanto aos serviços de pavimentação e execução do cordão de pedra uma vez que estava com excesso de rejuntamento em argila.
3. Nesse sentido, para fins de desbloqueio e para subsidiar a emissão de relatório de vistoria solicitamos manifestação da fiscalização acompanhada de relatório fotográfico evidenciando os serviços executados com destaque nesse trecho inicial.

Respeitosamente,

JULIANA PIAZZETTA VALENTE KUZECHEN
Engenheira Civil
Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CARLOS ANDRE CORREA CARDOSO
Coordenador de Filial

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CÉLIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Ofício 007/2023

AOS

SR. CARLOS ANDRÉ CORREA CARDOSO

ENGENHEIRO CIVIL

COORDENADOR DE FILIAL DE CASCAVEL/PR

REGOV/CV

SRA. JULIANA PIAZZETTA VALENTE KUZECHEN

Engenheira Civil

Representação da Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS TÉCNICAS IDENTIFICADAS EM VISTORIA EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0261 / 2023 / REGOV/CV

REF: CR 924496/2021/MAPA/CAIXA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS VICINAIS- LINHA BOA VISTA CRISTO REI, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE 924496/2021 MAPA/ CAIXA

Com relação ao **Ofício nº 0261 / 2023 / REGOV/CV**, em atendimento às solicitações apresentadas, venho apresentar esclarecimentos e justificativas em virtude do ocorrido, conforme passo a explicar abaixo:

Em vistoria na data de 17/03/2023, foi identificado que o referido trecho possuía deficiência em sua compactação. Além disso, apesar de existir o excesso de argila no trecho naquele momento, foi possível identificar a deficiência de rejuntamento argiloso entre as pedras irregulares do pavimento.

Perante a esta constatação a fiscalização solicitou a executora contratada que fizesse as devidas correções para que sanasse as patologias identificadas.

Sendo estas correções efetivas, entretanto resultou em um excesso maior de argila, o qual impossibilitou a avaliação da em vistoria.

Abaixo encaminho o registro fotográfico feito durante a execução do referido trecho para que a assim possa subsidiar a avaliação para emissão do relatório de vistoria.




Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

05449



1- DISTRIBUIÇÃO DO COLCHÃO ARGILOSO, ASSENTAMENTO DO POLIEDRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA

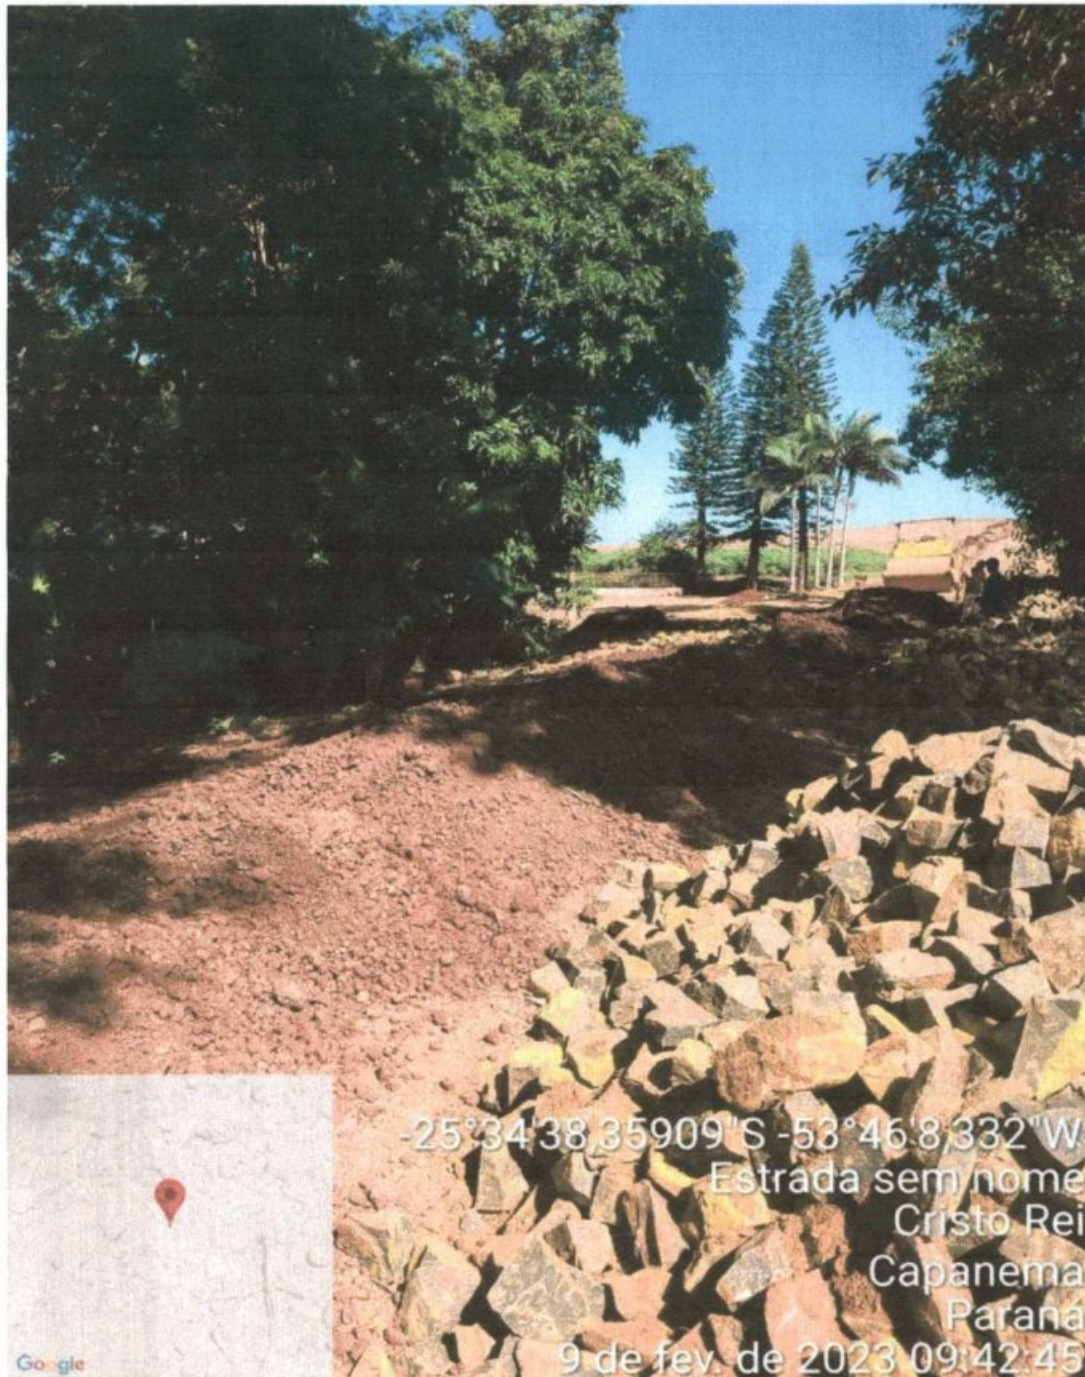

-25°34'38,35909"S -53°46'8,332"W
Estrada sem nome
Cristo Rei
Capanema
Paraná
9 de fev. de 2023 09:42:45

2- DISTRIBUIÇÃO DO COLCHÃO ARGILOSO, ASSENTAMENTO DO POLIEDRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA



-25°34'38,34041"S -53°46'8,28556"W

Estrada sem nome

Cristo Rei

Capanema


Paraná

9 de fev. de 2023 09:42:51

3- DISTRIBUIÇÃO DO POLIEDRO



4- PAVIMENTO ASSENTADO E COM COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO NECESSÁRIO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SENDO UTILIZADA PARA INTERDIÇÃO DO TRECHO.

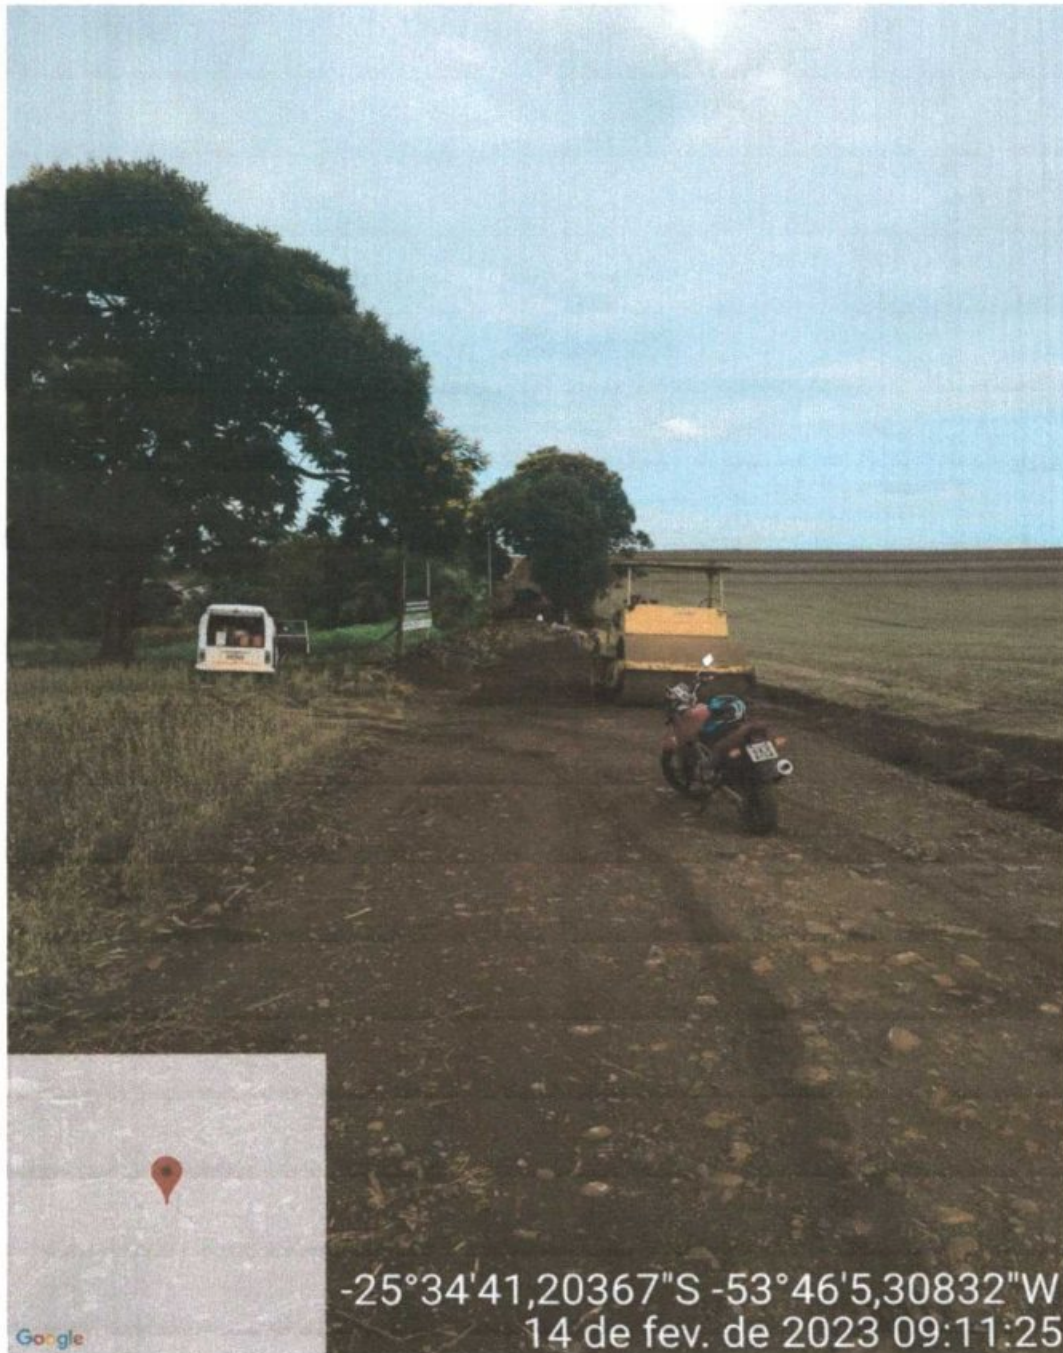


-25°34'41,20367"S -53°46'5,30832"W
14 de fev. de 2023 09:11:25

5- DISTRIBUIÇÃO DO COLCHÃO ARGILOSO, ASSENTAMENTO DO
POLIEDRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA




Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

0 S454

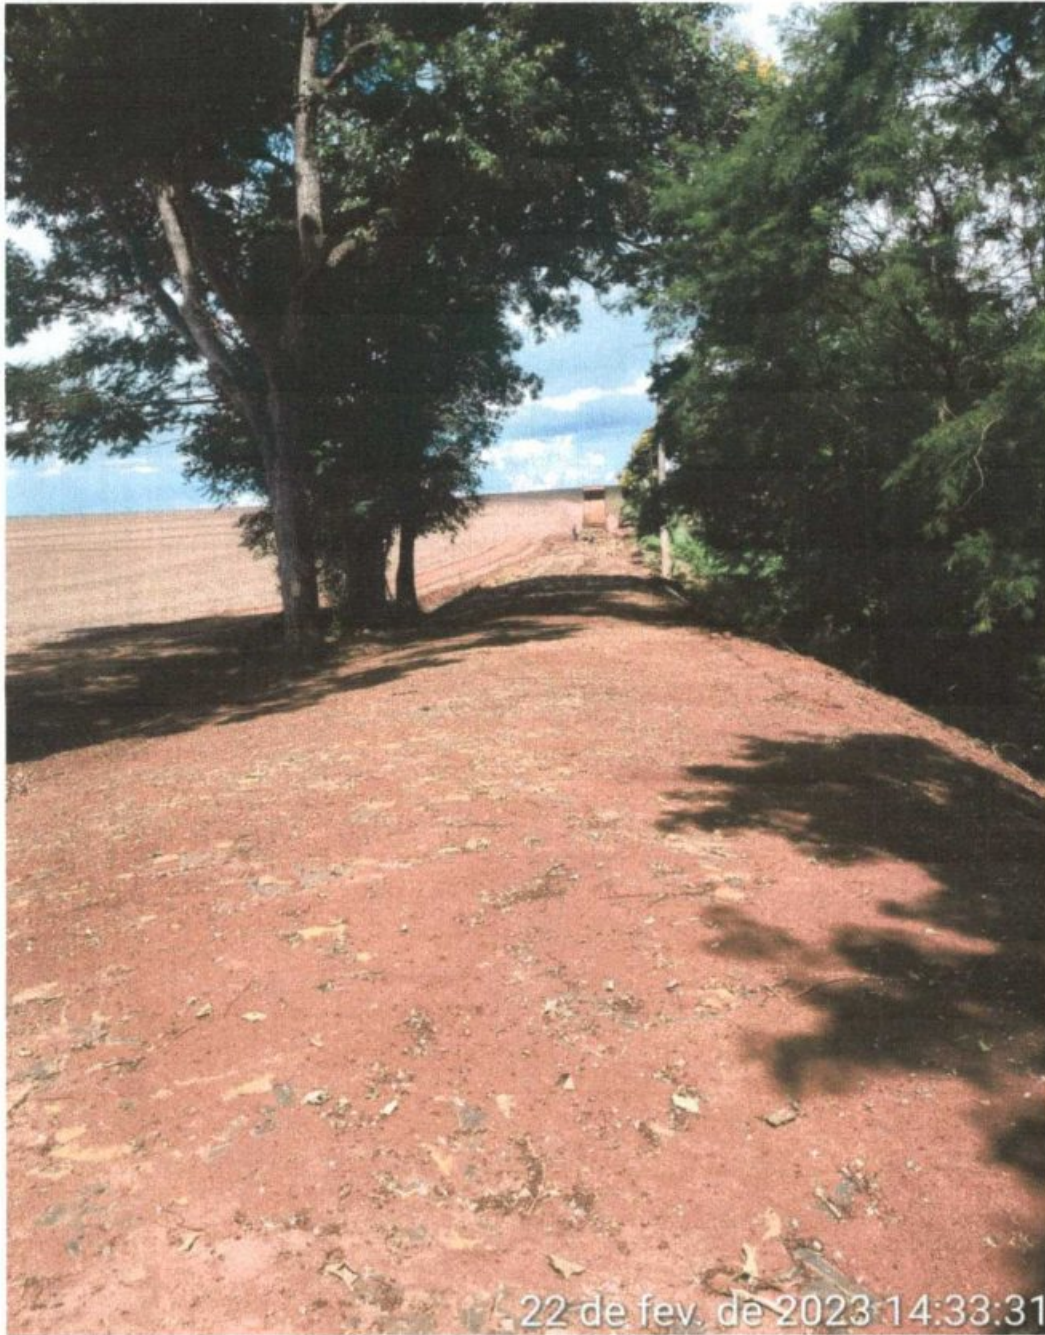

6- ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM COLCHÃO ARGILOSO DE
DESCARREGAMENTO DE MATERIAL.

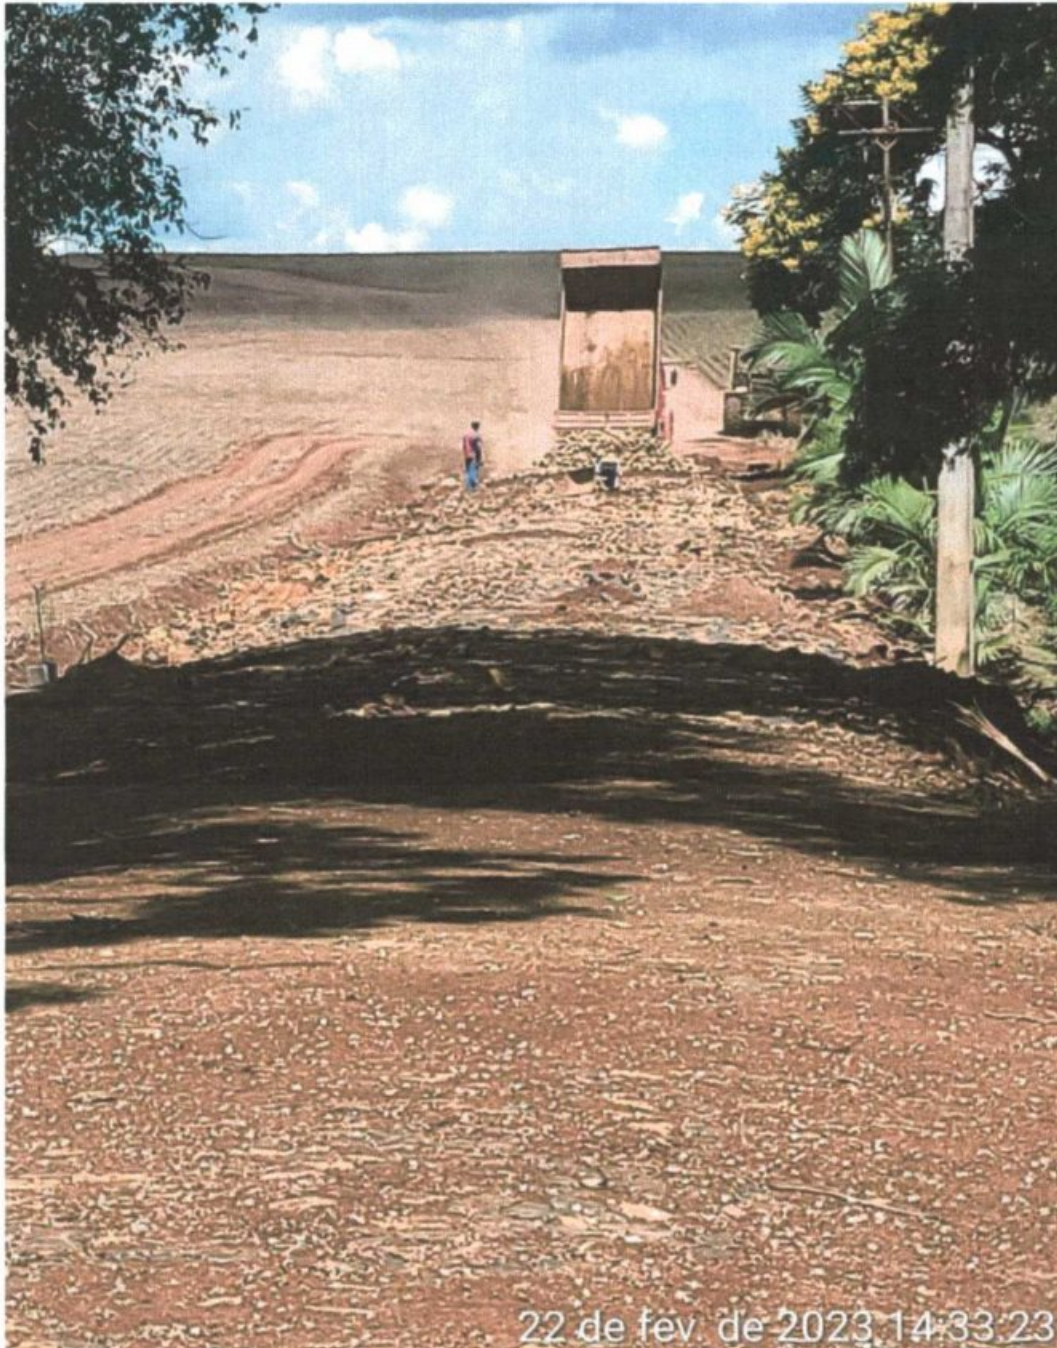

7- ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO EM COLCHÃO ARGILOSO DE
DESCARREGAMENTO DE MATERIAL.




Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

0 5456



8- PAVIMENTO ASSENTADO E COM COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO NECESSÁRIO.

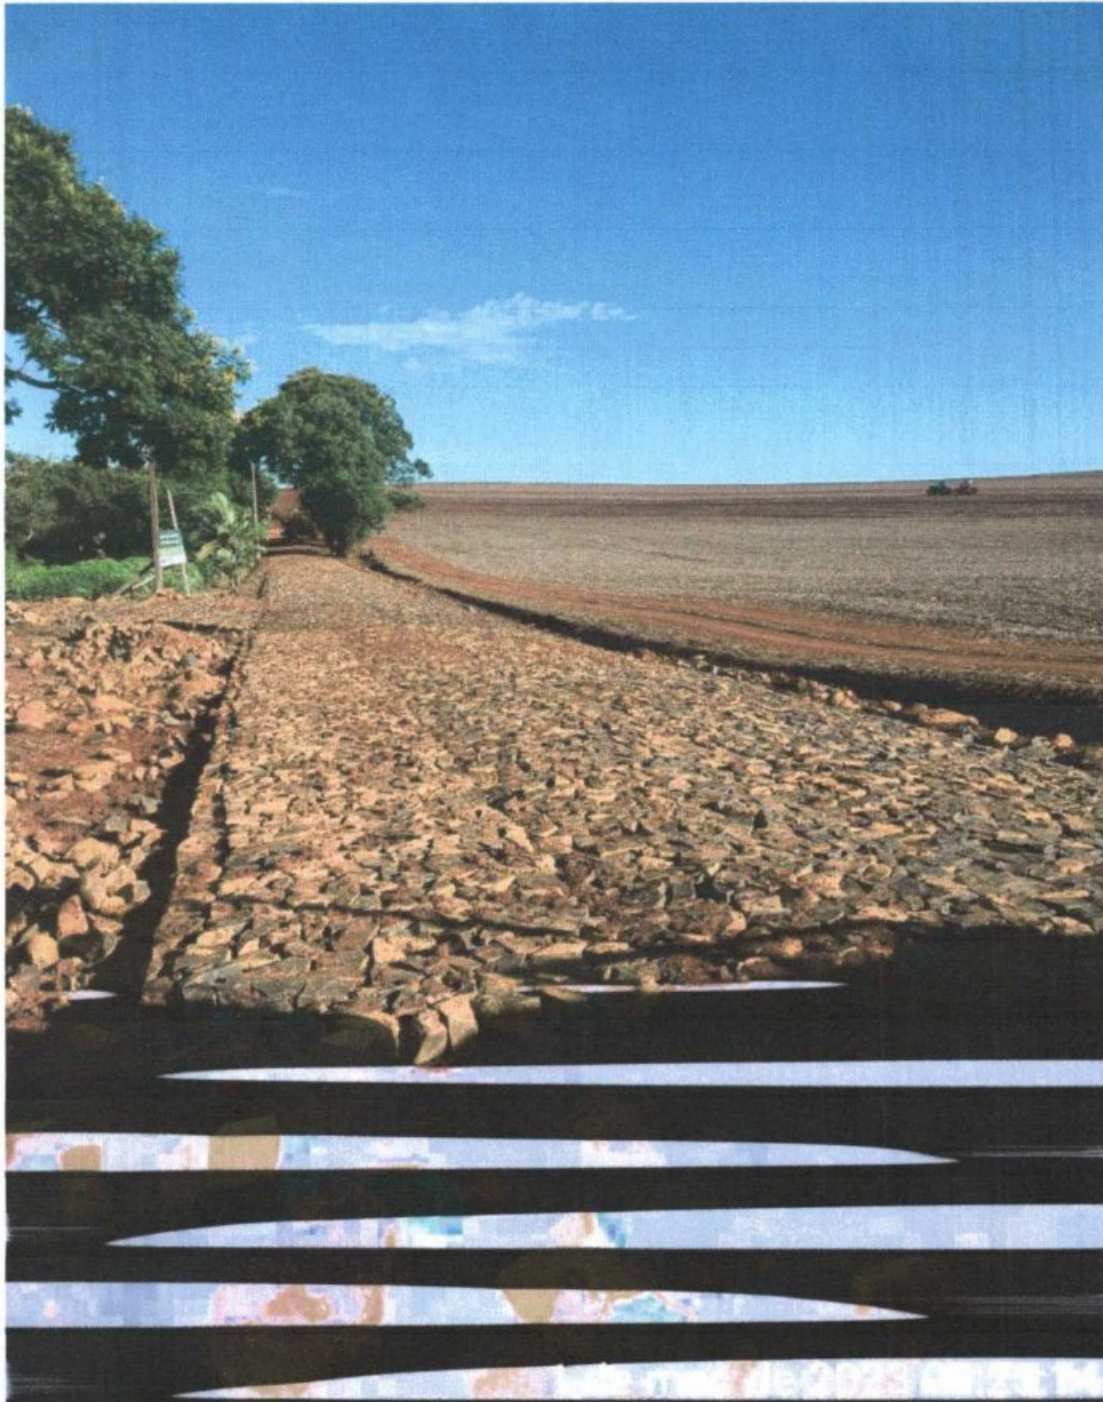

9- PAVIMENTO ASSENTADO E COM COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO NECESSÁRIO.



10-PAVIMENTO ASSENTADO E COM COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO NECESSÁRIO.




11-PAVIMENTO ASSENTADO E COM COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO NECESSÁRIO.



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

05460

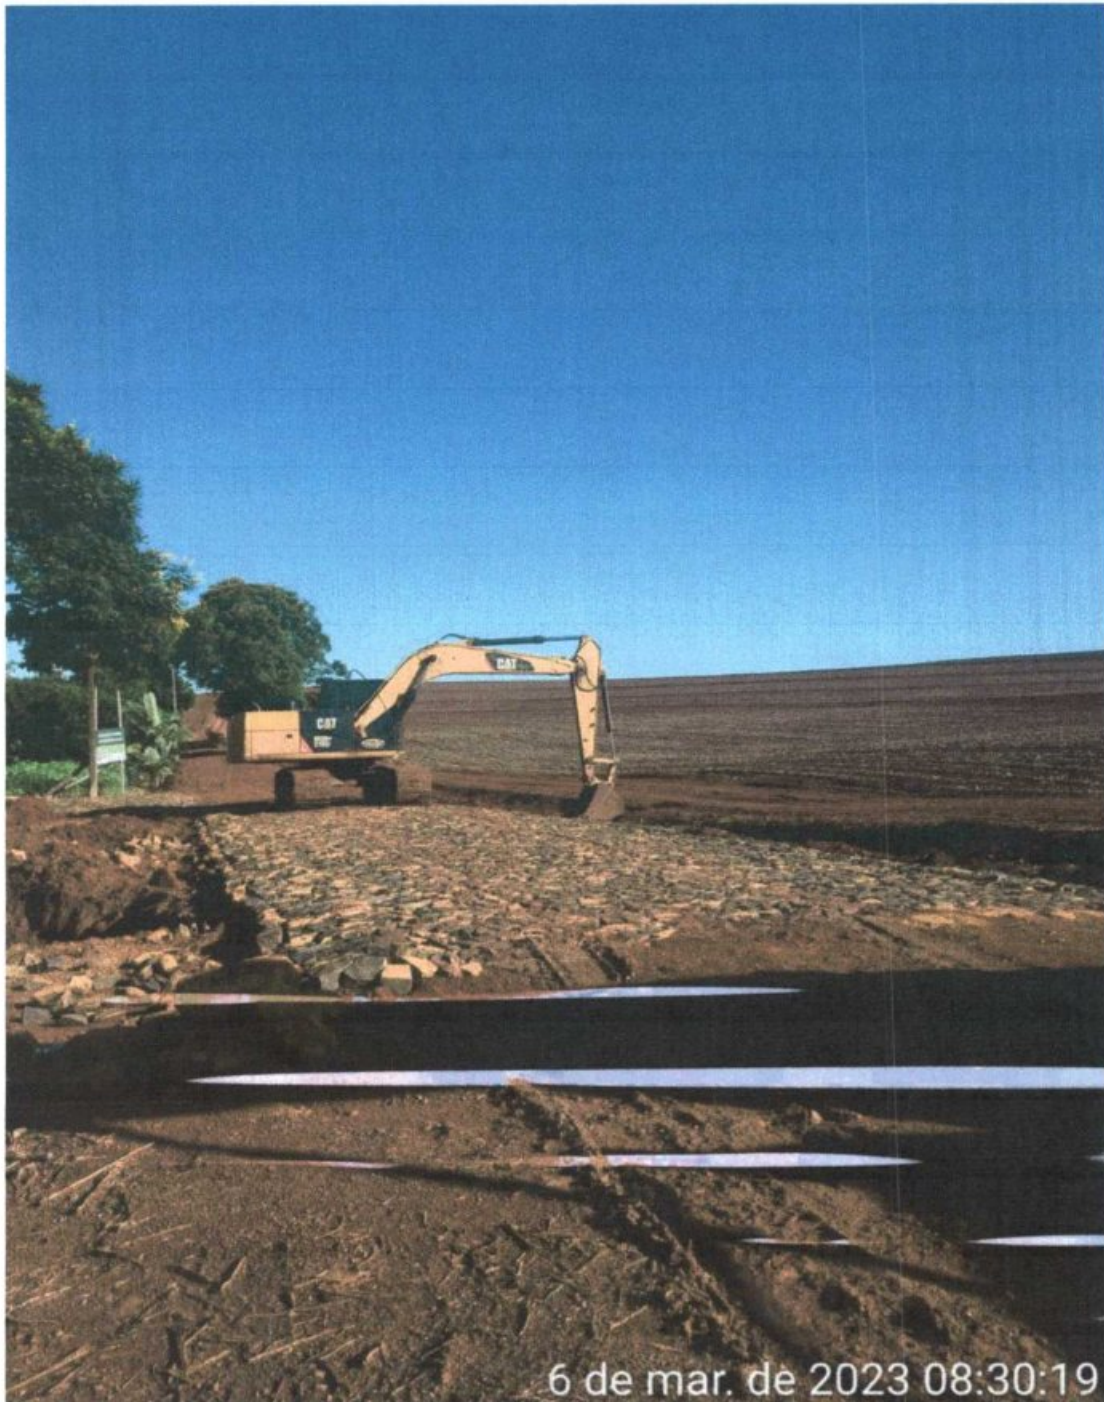


12-PAVIMENTO COMPACTADO, E PAVIMENTO ASSENTADO E COM
COMPACTAÇÃO INICIAL PARA SER EXECUTADO O REJUNTAMENTO
NECESSÁRIO.



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

0 3461

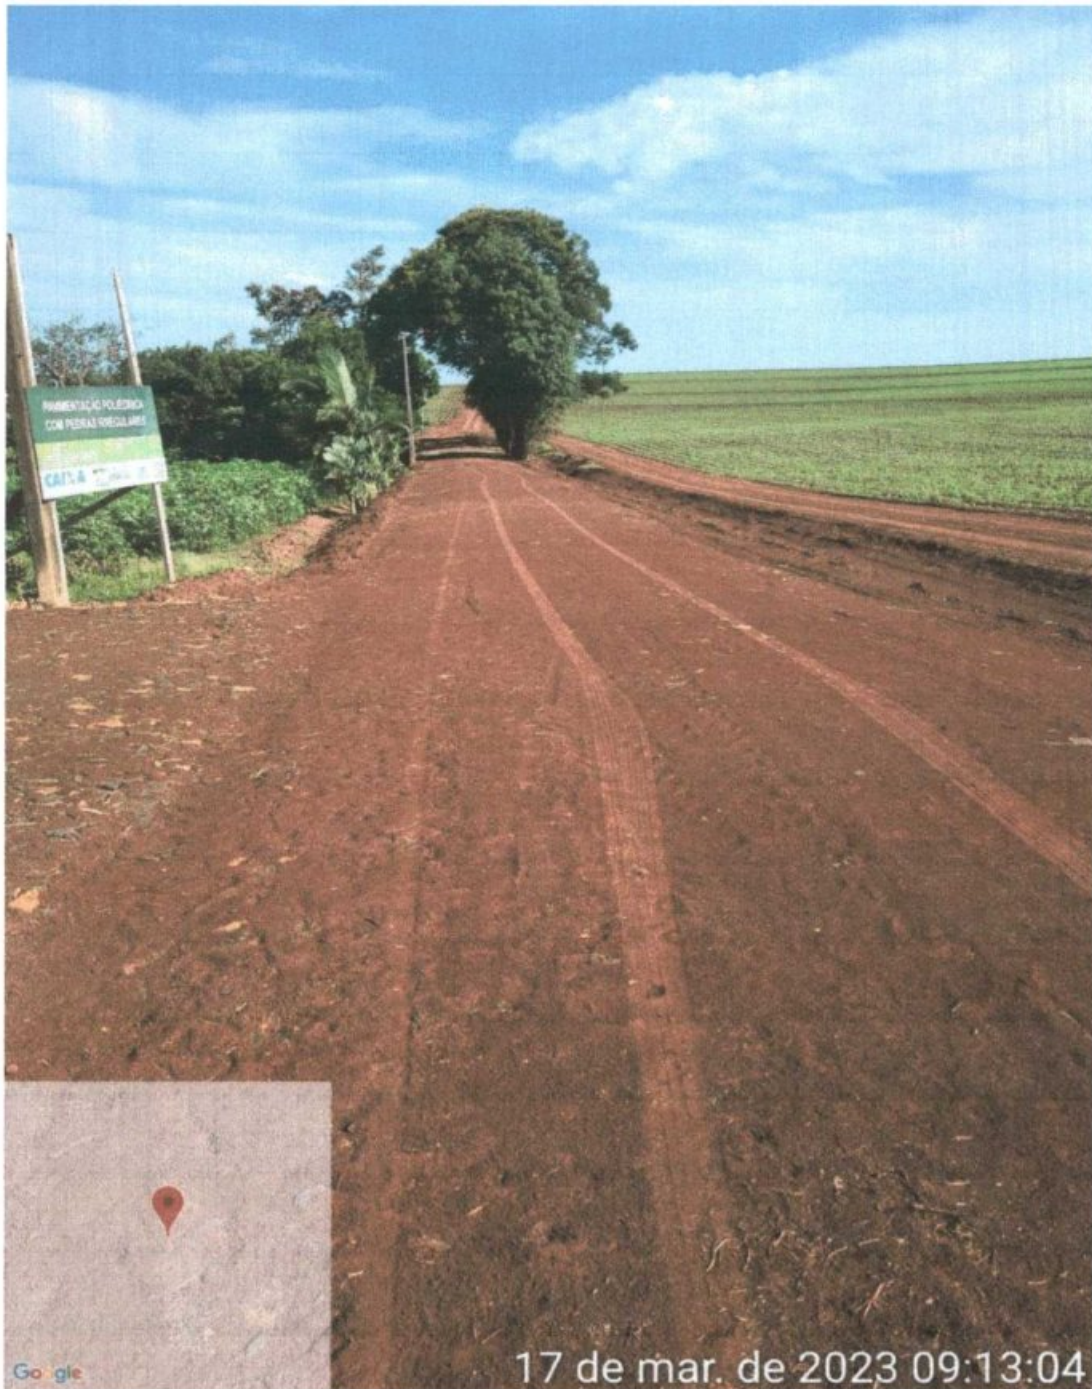


13-PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONCLUÍDA, PORÉM EXISTIA PATOLOGIAS A SEREM SANADAS.



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

0 \$462

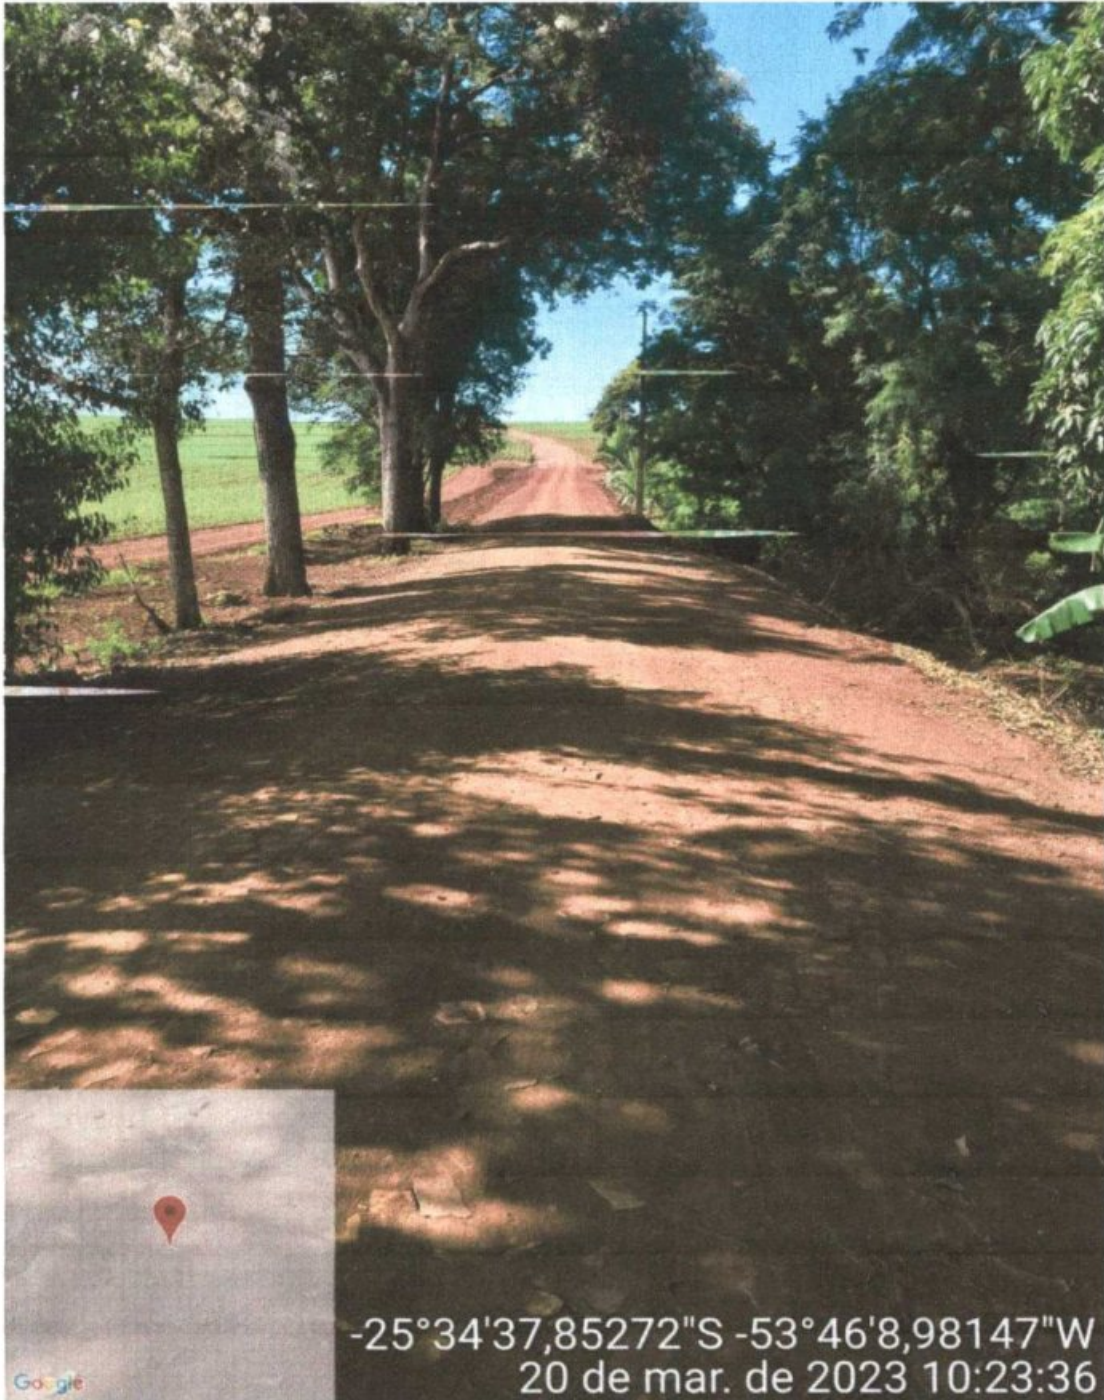


14-PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONCLUÍDA, PATOLOGIAS SANADAS.



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

05463

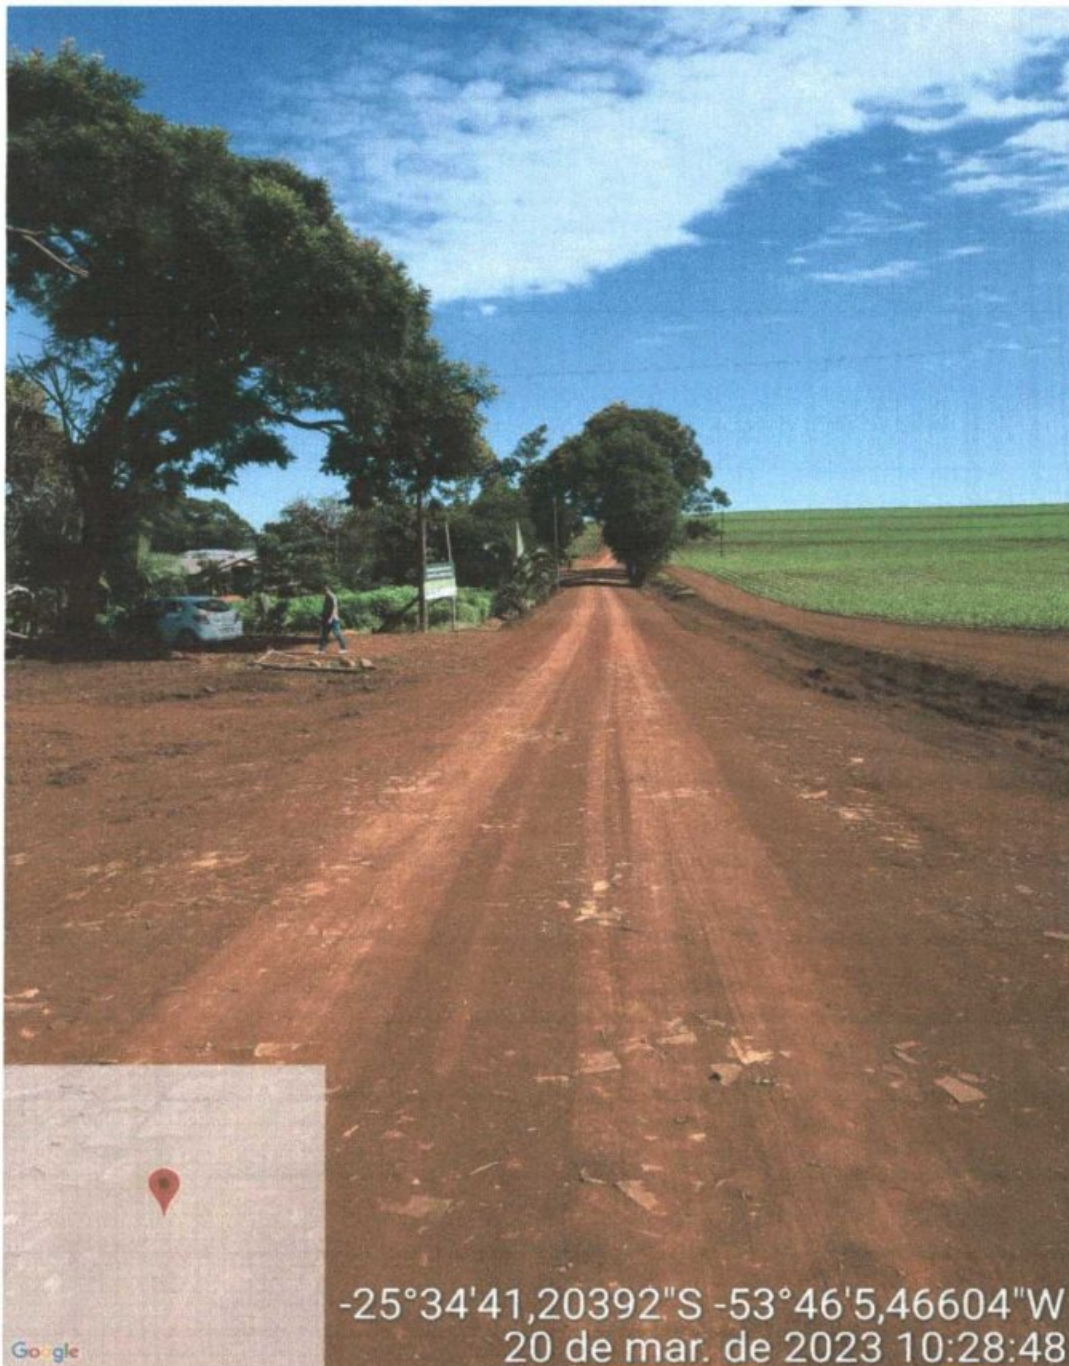

-25°34'41,20392"S -53°46'5,46604"W
20 de mar. de 2023 10:28:48

15-PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO CONCLUÍDA, PATOLOGIAS SANADAS.



Município de
Capanema - PR
Secretaria de Planejamento
e Projetos

0.5464

RESPEITOSAMENTE,

Capanema, 04 de abril de 2023

AMANDA PEREIRA DE
ANDRADE:013051832
82

Assinado de forma digital
por AMANDA PEREIRA DE
ANDRADE:01305183282
Dados: 2023.04.04 13:47:41
-03'00'

**AMANDA PEREIRA DE ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL MUNICIPAL
FISCAL DO CONTRATO
CREA RO-10505/D
MATRÍCULA 3523-1**

AMERICO
BELLE:240
59587915

Assinado de forma
digital por AMERICO
BELLE:24059587915
Dados: 2023.04.04
13:49:45 -03'00'

Americo Bellé
Prefeito do município de Capanema-PR.
