



FACHINELLO

CONSTRUTORA E ENGENHARIA

PROPOSTA DE PREÇOS

Cliente: Município de Capanema

Endereço: Av. Independência Chácara 84-4, Parque Industrial, Capanema - Pr.

Obra: Estrutura pré-moldada medindo 14m x 26,95m, pé direito de 7m. e 16x6,95m com pé direito de 4,90 e 6,70x6,95m com pé direito de 6,47m.

Especificações da obra:

1- Estrutura em concreto pré-fabricada:

- Fundação do tipo SAPATA.
- 23 Pilares com seção de 25cm x 35cm, com pé direito livre de 7m.
- Vigas baldrame não incluídas.
- 15 Vigas de cobertura de 15x40cm conforme projeto.

Valor: R\$ 165.000,00(Cento e sessenta cinco mil reais)

2- Fechamento.

- 63 placas de concreto para fechamento, medindo 1,20m de altura e 8cm de espessura, e comprimento variado de acordo projeto.
- Placas serão parafusadas nos pilares.

Valor: R\$ 189.000,00(Cento e oitenta mil reais)

3- Estrutura metálica de cobertura.

- 06 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 14,5 metros com fundo plano.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 17,05 metros treliçada e com tirante 16mm.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 10 metros treliçada.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11 de 2 metros
- 04 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11 de 3 metros
- Terças em viga "U" 100mm enrijecida, chapa 11.
- Contraventamento em aço A36 5/16"
- 01 Pannel metálico em viga "U" 100mm chapa 12 de 47,75 metros
- 01 Pannel metálica em viga "U" 100mm chapa 12 de 6,90 metros
- Telha metálica sanduiche 0,43mm, com parafusos auto-brocantes para colocação.

Valor: R\$ 280.000,00(Duzentos e oitenta mil reais)

Valor Total da Obra R\$ 634.000,00 (Seiscentos e trinta quatro mil reais)

Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo de execução: 05 meses.

Responsabilidade do cliente: Entregar o terreno limpo e nivelado. Fornecer água e energia elétrica bifásica. Entregar terreno com suas divisas devidamente locado por profissional habilitado. Fornecer sondagem do tipo SPT.

Sobre as fundações: Serviço orçado com estimativa de fundação direta, sendo necessário NSPT = 12 ou maior a 1,5m de profundidade em relação ao terreno nivelado, sem a presença de água ou de solo mole em camadas logo abaixo. Qualquer situação diferente poderá incorrer em alterações de custos. Todo o custo extra será de exclusiva responsabilidade do cliente.

Incluso na proposta: projeto estrutural do pré-moldado e ART do pré-moldado.

Capanema, 06 de junho de 2022.

Fachinello Construtora e Engenharia Ltda.

Fachinello Construtora e Engenharia Ltda.

Gustavo Mattes Fachinello
RG. 8.240.900-9 - CPF 048.399.349-71
Rua Tamoios, 688 - Capanema - PR

03.574.097/0001-34

FACHINELLO CONSTRUTORA
E ENGENHARIA LTDA.

RUA TAMOIOS, 688

CENTRO

85760-000 - CAPANEMA - PR

CNPJ: 03.574.097/0001-34

fachinello@wln.com.br

I.E.: 90599602-93

Rua Tamoios, 688 - centro - Fone: 46 3552-1196 - 85760-000 - Capanema - Paraná

Cliente: Município de Capanema -PR

Endereço: Av. Independência Chácara 84-4, Parque Industrial, Capanema - Pr.

Obra: Estrutura pré-moldada medindo 14m x 26,95m, pé direito de 7m. e 16x6,95m com pé direito de 4,90 e 6,70x6,95m com pé direito de 6,47m.

Estrutura em concreto pré-fabricada:

- Fundação do tipo rasa.
- 23 Pilares com seção de 25cm x 35cm, com pé direito livre de 7m.
- Vigas baldrame não incluídas.
- 15 Vigas de cobertura de 15x40cm conforme projeto.

Valor: R\$ 175.000,00(Cento e setenta cinco mil reais)

Fechamento de placas.

- 63 placas de concreto para fechamento, medindo 1,20m de altura e 8cm de espessura, e comprimento variado de acordo projeto.
- Placas serão parafusadas nos pilares.

Valor: R\$ 192.000,00(Cento e noventa dois mil reais)

Estrutura metálica de cobertura.

- 06 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 14,5 metros com fundo plano.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 17,05 metros treliçada e com tirante 16mm.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11, de 10 metros treliçada.
- 02 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11 de 2 metros
- 04 Tesouras metálicas em viga "U" 100mm chapa 11 de 3 metros
- Terças em viga "U" 100mm enrijecida, chapa 11.
- Contraventamento em aço A36 5/16".
- 01 Painel metálico em viga "U" 100mm chapa 12 de 47,75 metros
- 01 Painel metálica em viga "U" 100mm chapa 12 de 6,90 metros
- Telha metálica sanduiche 0,43mm, com parafusos auto-brocantes para colocação.

Valor: R\$ 291.000,00(Duzentos e noventa um mil reais)

Valor Total R\$ 658.000,00 (Seiscentos e cinquenta oito mil reais)

Santo Antônio do Sudoeste, 06/06/2022

MAURICIO MACHADO DE SOUZA
Eng.º Civil - CREA N.º 25846-D
CPF 661.610.619-53 / CIC 4360641-7
PRT 163, s/n - Trevo Saída p/Pranchita
85710-000 - Sto. Antonio do Sudoeste

FRONSUL ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ 10.958.382/0001-14 - I.E. 90487408-60
PRT 163, s/n - Trevo Saída p/Pranchita
85710-000 - Sto. Antonio do Sudoeste - PR

MAURÍCIO MACHADO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 25.846/D

A EVOLUÇÃO COM NOVOS ARES

Razão Social:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		(X) Orçamento () Pedido	
Nome Comercial/Fantasia:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA			
Endereço:		TRV Djalma Dutra		15/06/2022	
Município:		CAPANEMA			
CEP:		68.700-020			
CNPJ/CPF:		05.149.091/0001-45		REPRESENTANTE	
Inscrição Estadual:				FISCHER REPRESENTAÇÕES EDUARDO (46) 99102-0274 FISCHERREPRESENTACOESPR@GMAIL.COM	
Comprador:					
Telefone:		(46) 3552-1321			
E-mail:					
Medição:		C x L x A =			
		Taxa de troca de ar : Insuflamento: Exaustão:			
Item	Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor dos Itens	
1	3	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO ROTO 160 CONFORT C/ SWING	R\$ 20.300,00	R\$ 60.900,00	
2				R\$ -	
3				R\$ -	
4				R\$ -	
5				R\$ -	
Total Produtos				R\$ 60.900,00	
INSTALAÇÃO					
1				R\$ -	
2				R\$ -	
3				R\$ -	
4				R\$ -	
Total Serviços				R\$ -	
Condições					
Condições de pgto	Entrada 30% + 30, 60, 90 dias s/ juros		Nota Produtos	R\$ 60.900,00	
Formas de pgto	Depósito, boleto, BNDES, PROGER, LEASING.		Nota Serviços	R\$ -	
Prazo de entrega	Em até 15 dias ou entrega programada.		TOTAL	R\$ 60.900,00	
Prazo instalação					
Frete	(X) CIF () FOB - Transportadora:		O.C Nº		
Instalação	() Representante () Cliente				
OBSERVAÇÕES:			Instalação por conta do cliente: Locação de muk e andaime, serviços de funilaria e metalúrgica (se necessário) ponto de água e energia, espuma expansiva.		
Proposta válida por 15 dias			Assinatura e carimbo do cliente		



Brisainox Industria E Comercio LTDA - EPP
 CNPJ: 05.436.372/0001-89
 IE: 907.155.382-2
 Endereço: Rua Crissiumal, N° 880
www.brisainox.com.br

"Seu Ambiente Na Temperatura Ideal"

Nova Santa Rosa - PR, 10 de Agosto de 2021

Proposta Comercial

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA				
Endereço	AVENIDA INDEPENDENCIA			N°	
Bairro	PARQUE INDUSTRIAL	Compl.	CH. 84 A	CNPJ/CPF	
Cidade	CAPANEMA PR	CEP		IE/RG	
A/C			E-mail		

Produto


Climatizador BX 500

Orçamento

Quant.	Modelo equipamento	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
3	Climatizador BX 500	R\$ 15.100,00	R\$ 45.300,00
1	Mão de obra	R\$ -	R\$ -
1	Frete	R\$ -	R\$ -
1	Caminhão munck	R\$ -	R\$ -

Valor Total R\$ 45.300,00

Forma De Pagamento: A VISTA

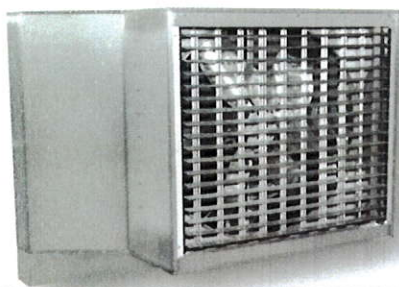


Especificação Técnica

Dimensões	165x220x108
Abert. Telhado	141x141
Peso Equipamento	165Kg
Vazão De Ar	45.000m³/h
Área Climatizada	Até 500m²
Tensão Elétrica	220V
Consumo de Energia	1,70Kw/h
Motor Da Hélice	1,00cv

Observações:

Ponto de água e energia por conta:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Materiais para instalação por conta:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Eletrecista / Encanador por conta:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Vedação de possiveia áreas:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Despesas com caminhão guincho:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Acabamento interno e externo:	Brisainox	()	Cliente	(x)
Frete:	CIF	Prazo De Entrega:	15 à 25 dias	

Orçamento válido por 15 dias



Razão Social ALBERTI E SILVA LTDA
Nome Fant Climax Climatização de Ambientes
CNPJ 41.828.326/0001-99
Insc. Estadual 9074823405
Endereço Rua Sibipiruna, Nº 100 / Fundos
Cidade Capitão Leônidas Marques / PR
Telefone (45) 3286 - 3008 / (45) 99935-2771
Email: vendas2@climax.ind.br

Data 15/06/2022
Bairro São Gabriel
CEP 85.790-000
Site www.climax.ind.br
financeiro@climax.ind.br

ORÇAMENTO


Razão Social Município de Capanema
Nome Fant Capanema Prefeitura Gabinete do Prefeito
CNPJ 75.972.760/0001-60
Endereço Av. Gov. Pedro V. Parigot de Souza, 1080
Cidade Capanema - PR
Telefone (46) 3552-1321

Bairro Centro
CEP 85760-000

Quantidade	Descrição	Valor Unt.	Valor Total
3	Climatizador Evaporativo Mod C 1500	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00

Ficha Técnica: Climatizador Evaporativo Mod C 1500

Consumo Elétrico: 1,3 Kw/h
Tensão Elétrica: 220 V
Frequência: 60 Hz
Área Climatizada: 300 a 600 m²
Potência do motor: 1,5 CV
Gabinete em Fibra de Vidro
Vazão do Ar: 42.000 m³
Hélice de Aço Inox
Filtro/Grelha em Aço Inox Dupla Deflexão
Suporte de Fixação do Aparelho
Dimensões: 1,80 x 1,73 x 1,20 m (AxLxP)
Abertura de Parede: 1,41 x 1,41 m (AxL)
Peso: 140 kg
Acionamento: Pannel de Comando com Controle Remoto com várias velocidades - marca Ageon
IRX Pro 20-3S
Instalação inclusa

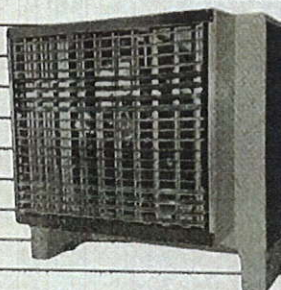

TOTAL ORÇAMENTO R\$ 45.000,00

OBSERVAÇÕES

Prazo de fabricação: 15 dias úteis

Garantia do produto: 06 meses

Pagamento: () à prazo

(X) à vista

Frete: () destinatário

(X) emitente (Climax)

Instalação: () cliente

(X) empresa (Climax)

O cliente se compromete a fazer abertura de parede de 1,41 x 1,41 m e deixar um ponto de água e ponto de luz 220 V para a empresa estar realizando a instalação

CLIENTE

CLIMAX - ALBERTI E SILVA LTDA
CNPJ: 41.828.326/0001-99
IE: 9089707487

VENDEDOR

SOS EMPREENDIMENTOS

AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 815, CENTRO



CNPJ: 18.691.563/0001-39

ORÇAMENTO Nro: 175

DATA DO ORÇAMENTO: 21/06/2022

Tel: (45)99993-5491 - CAPANEMA-PR

VENDEDOR: WILKINSON DIAS OLIVEIRA

CONTATO: 46999239417

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

EMAIL:

OBRA:

TELEFONE:

ENDEREÇO: avenida independencia, s/ parque industrial

CEP: 85760000

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



PORTÃO DE CORRER COM BARROTES HORIZONTAIS

*COR PERFIL: PINTURA BRANCO BRILHANTE *COR ACESSÓRIO: PRETO

LINHA: L. COBERTURA

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	4100	2100	SEM VIDRO	4.010,61	4.010,61

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



PORTÃO DE CORRER COM BARROTES HORIZONTAIS

*COR PERFIL: PINTURA BRANCO BRILHANTE *COR ACESSÓRIO: PRETO

LINHA: L. COBERTURA

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	3100	2100	SEM VIDRO	3.492,75	3.492,75

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



PORTÃO ELEVÇÃO LMB. VID. BAR.

*COR PERFIL: PINTURA BRANCO BRILHANTE *COR ACESSÓRIO: PRETO

LINHA: L. COBERTURA

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	3400	2400	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	6.897,15	6.897,15

OBSERVAÇÕES

... PRAZO DE ENTREGA - A CONTRATADA TEM O PRAZO DE 15 A 25 DIAS CORRIDO PARA A ENTREGA DAS ABERTURAS, APOS A MEDIÇÃO FINAL DE TODOS OS ITENS RELACIONADOS NO PEDIDO CONTRATADO PELO O CONTRATANTE.

... ATRASO NA ENTREGA- A CONTRATADA PODERÁ TEM ATRASO NA ENTREGA QUANDO, O FORNECEDOR DE MATERIA PRIMA NÃO FAZER A ENTREGA NA SEMANA DE ENTREGA, OU POR CONTA DA VARIAÇÃO CLIMATICAS, A CONTRATADA DEVERA AVISAR O CONTRATANTE DA NÃO COMPRIMENTO DA DATA PREVISTA DA ENTREGA FIRMANDO UMA NOVA DATA.

... FORMA DE PAGAMENTO - PIX, CARTÃO DE CREDITO OU CHEGUE.

OBS: (ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS)

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: 14.400,51 SOS EMPREENDIMENTOS

ASSINATURA DO CLIENTE OU RESPONSÁVEL

TOTAL: 14.400,51

SEM DESCONTO 0.00

TOTAL GERAL: 14.400,51

Atenciosamente,

WILKINSON DIAS OLIVEIRA
46999239417

Dt.Venda: / /

Impresso em: 21/06/22

Aceite do Cliente

SOS EMPREENDIMENTOS

**UNI ALUMÍNIOS**

GUARAÇAS, 2126, SÃO CRISTOVÃO

CAPANEMA | PR

CNPJ: 36.407.841/0001-65

I.E : 9083780247

uniaaluminios@gmail.com

Cep: 85760-000

Tel: (46)99924-0116

Tel 2: (46)3030-1024

Whats:

ORÇAMENTO


Numero: 2050

Emissão: 21/06/2022

Vendedor: GEAN FOCHE SATTO

Contato: (46)99900-5376

Email: geanfocesatto@hotmail.com

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA**EMAIL:****ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDENCIA, S/N PARQUE INDUSDRIAL****CEP: 85760-000 CAPANEMA/PR -****TEL. FIXO:****CELULAR****TEL2/Fax:****IE/RG:****CNPJ/CPF:*****LOCAL/AMBIENTE:****TIPO:****PORTÃO BASCULANTE COM LAMBRIL LISO COM VIDRO NA HORIZONTAL E BARROTES SUP /INF E PORTÃO SOCIAL*****COR PERFIL: BRANCO*****COR ACESSÓRIO: PRETO****LINHA: PORTÕES**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL
1	1	3400	2400	TEMPERADO INCOLOR 4 MM	9.077,05	9.077,05

COM DOIS MOTOR 12 SEGUNDO DE ABERTURA E FECHAMENTO COM VALOR DE 781,04 REAIS CADA

COM VIDRO NO MEIO E 4 MM TEMPERADO 400 MM DE ALTURA E A CHAPA COM 600 MM DE ALTUA CADA

COM A SOCIAL DE 800 MM LARGURA

LOCAL/AMBIENTE:*TIPO:****PORTÃO DE CORRER COM BARROTE NA HORIZONTAL 25 X 35*****COR PERFIL: BRANCO*****COR ACESSÓRIO: PRETO****LINHA: PORTÕES**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL
2	1	4100	2100	SEM VIDRO	4.886,41	4.886,41

COM 1 MOTOR DESLIZANTE HAB = 616,19 REAIS

COM QUADRO 100 X 50 E BARROTES ORIZONTAL COM 25X35

LOCAL/AMBIENTE:*TIPO:****PORTÃO DE CORRER COM BARROTE NA HORIZONTAL 25 X 35*****COR PERFIL: BRANCO*****COR ACESSÓRIO: PRETO****LINHA: PORTÕES**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL
3	1	3100	2100	SEM VIDRO	4.110,50	4.110,50

COM 1 MOTOR DESLIZANTE HAB = 616,19 REAIS

QUADRO 100 X 50 E BARROTES ORIZONTAL COM 25X35

OBSERVAÇÕES

_ PRAZO DA ENTREGA DO PEDIDO: APÓS MEDIÇÃO FINAL DOS ITENS RELACIONADOS DO PEDIDO TEMOS UM INTERVALO DE 20 A 30 DIAS PARA AS INSTALAÇÕES, DOS ITENS DO PEDIDO.

_ FORMA PARA PAGAMENTO : ENTRADA DE _____ RAIS OUTRO RESTANTE SERRA GUITADO NA ENTREGA DO PEDIDO NO VALOR DE _____ REAIS.

_ SOBRE OS CUSTOS DOS ITENS: QUANDO O PEDIDO FOR ALTERADO PARA AJUSTAR PROJETOS SEJA POR MOTIVO DE DIÂMETROS IRREGULARES OU TROCA DE COR , MODELOS ,VIDROS, ETC. PODERÁ IMPLICAR NO VALOR DOS CUSTO DOS PROJETOS ORÇADOS, POIS O SISTEMA RECALCULARA TODA MATÉRIA PRIMA UTILIZADAS NOS PROJETOS DOM PEDIDO.

	TOTAL:	18.073,96	
	SEM DESCONTO	0.00	
	TOTAL GERAL:	18.073,96	Atenciosamente,
			GEAN FOCHE SATTO (46)99900-5376
Dt.Venda:	/ /		
Impresso em:	21/06/22	Aceite do Cliente	UNI ALUMINIOS

